


Экспликация зданий и сооружений

№ по ГП	Наименование	Примечание
1	ЛСК очередь 1	проектируемая
3	Мини-ТЭЦ	проектируемая
4	КТП-1	проектируемая


Условные обозначения

	Проектируемое здание		Дороги, проезды
	Ограждение строительной площадки без козырька		Зона размещения временного служебно-бытового комплекса
	Дополнительные временные проезды		Монтажный кран
	Временные проезды по трассам проектируемых		Стойка монтажного крана
	Пржектор		Знак ограничения скорости
	Место складирования		Дизель-генератор
	План пожарной защиты		Шлагбаум
	Знак предупреждающий о работе крана		РиБ
	Линия границы опасной зоны от здания		Воздушные сети временного электроснабжения 0,4/0,23 кВ
	Линия границы опасной зоны от крана		Знак аккрецирующий проходы
	Стенов со схемой строповок		Ворота
	Распределительный щит, рубильник		Направление движения пешеходов
	Въезд (выезд) на строительную площадку		Пожарный пост
	Направление движения пешеходов		Паспорт объекта со схемой дорожного движения
	Работать в защитной каске		Мойка для колес автотранспорта
	Контейнер для сбора бытового мусора		Место стоянки автомашин под разгрузкой
	Бачка с водой		ДЭС
	Контейнер для сбора строительного мусора		

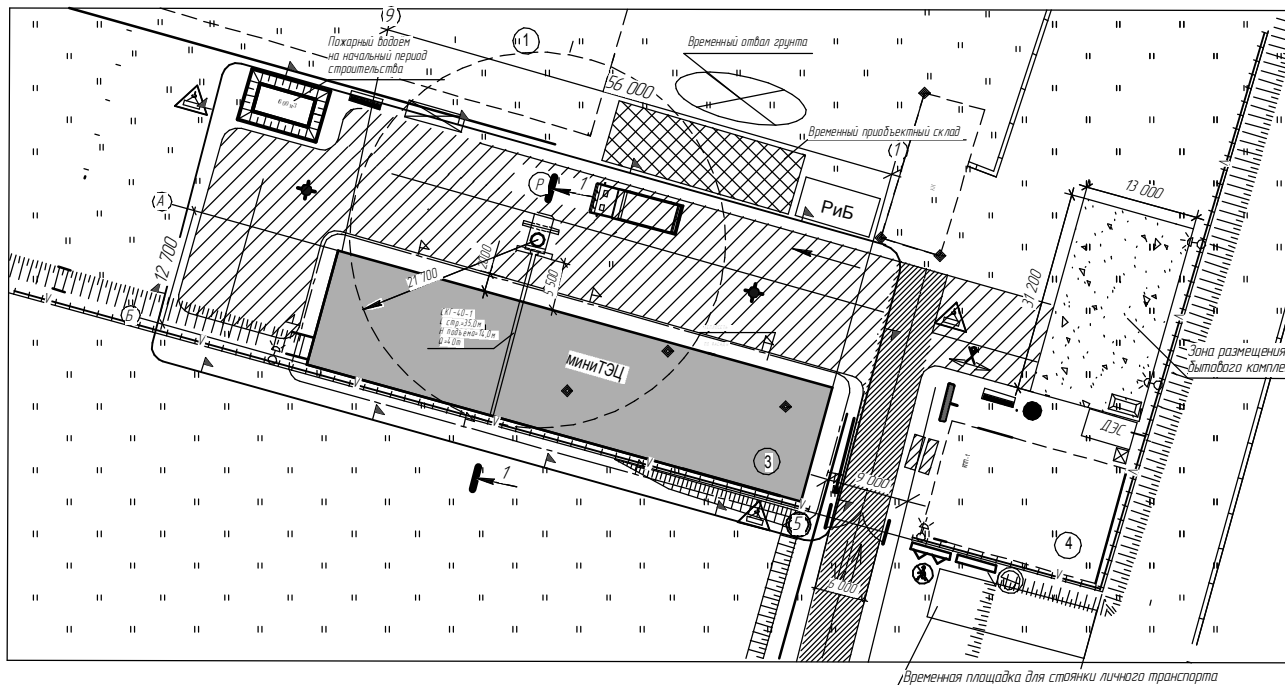

временная площадка для стоянки личного транспорта

Фрагмент ограждения стройплощадки

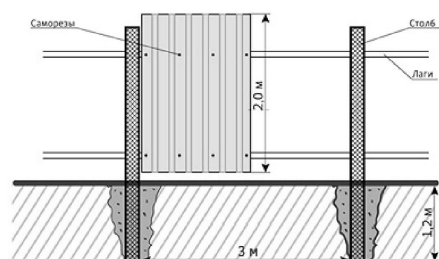

Общие указания

- Данный стройгенплан разработан на основной период строительства мини ТЭЦ (возведение надземных зданий и сооружений) с использованием данных чертежа генплана, шифр 1/11-11-ГП.
- На стройгенплане представлены:
 - установка монтажных кранов и зоны их действия;
 - граница опасной зоны действия крана;
 - складские площадки в зоне действия крана;
 - мероприятия по организации стройплощадки, выполненные в подготовительный период.
- Пояснения по стройгенплану смотреть в пояснительной записке.
- Разрез 1-1 на листе 5 комплекта чертежей ПОС
- При разработке ППРк предусмотреть график совместной работы кранов, а также прокладку инженерных сетей производить с учетом устройства канальных путей монтажных кранов.
- Разработку стройгенплана в составе ППР осуществлять в соответствии с указаниями по безопасности труда СНиП 12.1-2004, СНиП 12.3-2001, СНиП 12.4-2002, СП 12-103-2002, СП 12-136-2000, ПБ 01-03, СанПиН 2.2.3.1384-03; РД 11-06-2007, ПОТ РМ-007-98, ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34, 0-03, 150.00, ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ, ГОСТ 12.3.009-76*

- Столбы для забора квадратного и круглого сечения;
- Лаги (поперечины), металлические уголки.
- Крепеж для профнастила - саморезы. Могут быть просто оцинкованными и цветными (в зависимости от цвета листа). Не требуют предварительного засверливания.

				1/11-11-ПОС			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Басик						
Проб.	Родионов						
Контр.							
Инж.контр.	Митин						
Утв.							
Строительство и газификация производственной базы ВЕРГАРТ в составе складского и ремонтного терминалов, а также инженерной инфраструктуры Мини-ТЭЦ.					Лист 1	Листов 1	
Стройгенплан					ЗАО "ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион"		
