


**Ведомость объемов работ
подготовительного периода.**

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Временные здания	5 шт.	Инв. блок-конт. 6,0 x 2,4 x 2,5 м
2	Туалетные кабинки	2 шт.	
3	Помещение охраны (пост охраны)	1 шт.	Инв. блок-конт. 2,5 x 2,4 x 2,5 м
4	Контейнер для бытового мусора	2 шт.	Емкость 0,75м3.
5	Контейнер для строительных отходов	2 шт.	Емкость 8,0м3.
6	Место для курения	10 м2	
7	Арматурный цех	1 шт.	5,0 x 9,0 = 45м2. Под навесом.
8	Место кантовки опалубки	1 шт.	4,0x4,4 =17,6м2
9	Площадка приема раствора и бетона	1 шт.	4,0 x4,4 =17,6м2.
10	Стенд со схемами строповок	2 шт.	Под навесом.
11	Информационный стенд стройплощадки	1 шт.	
12	Стенд с противопожарным инвентарем	4 шт.	
13	Шкаф для хранения баллонов с кислородом	1 шт.	
14	Шкаф для хранения баллонов с ацетиленом	1 шт.	
15	Место хранения съёмных грузозахватных приспособлений и тары (ГЗП)	1 шт.	Под навесом.
16	Площадка складирования из щебеночного основания толщиной 200 мм.	80,2м2 (16м3)	
17	Временное ограждение стройплощадки (сетка в рамке на блоках ФБС).	176,0м	
18	Установка для мойки колес.	1 шт.	
19	Ворота	1 шт.	
20	Установка прожекторов освещения	6 шт.	ПЭС-45


Условные обозначения

	Проектируемое здание
	Площадка для стоянки техники
	Выезд-въезд на строительную площадку
	Направление движения транспорта
	Контейнер для строительных отходов
	Контейнер для бытового мусора
	Стенд со схемами строповок
	Информационный стенд стройплощадки
	Стенд с противопожарным инвентарем
	Фонари сигнального освещения
	Мойка колес типа "Мойдодыр-К-4,5"
	Въездные (выездные) ворота
	Ограждение строительной площадки
	Место для курения
	Знак ограничения скорости движения транспорта
	Знак №4, запрещающий проход людей
	Знак №3, предупреждающий о работе крана
	Прожекторная мачта
	Биотуалетная кабинка
	Временные бытовые сооружения в 2 этажа
	Пост охраны
	Место хранения СГП и тары
	Место хранения контрольного груза
	Шкаф для хранения баллонов с кислородом
	Шкаф для хранения баллонов с ацетиленом
	Раствор, бетон
	Площадка приема раствора и бетона
	Площадка для складирования и кантовки опалубки
	Арм. цех
	Обслуживаемая емкость для сбора канализационных вод

Схема защиты существующих деревьев от возможных повреждений.

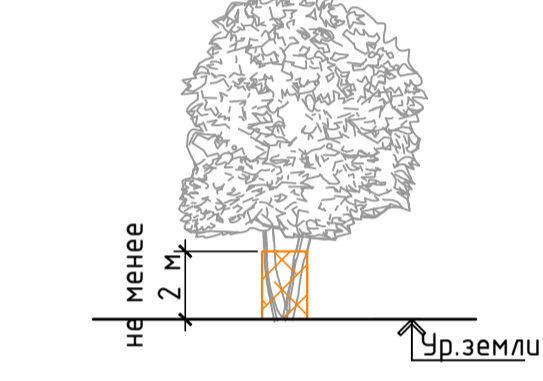


Конструкция площадок складирования

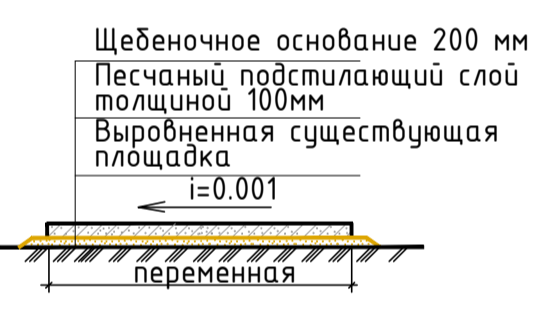


- УКАЗАНИЯ К СТРОЙГЕНПЛАНУ**
- Стройгенплан разработан на период реконструкции и технического перевооружения производственного комплекса, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, станция Шуйская, Кондопожское шоссе, д.8
 - В состав работ подготовительного периода входят:
 - установка временного ограждения стройплощадки в пределах отведенной территории согласно стройгенплана;
 - организация охраны строящегося объекта и строительной площадки;
 - установка временных зданий и сооружений бытового и производственного назначения;
 - защита сохраняемых деревьев, расположенных в непосредственной близости от места производства работ, деревянными коробами высотой не менее 2-х метров;
 - устройство мойки колес автотранспорта с оборотным водоснабжением при выезде со стройплощадки;
 - прокладка временных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации по проекту, разработанному строительной организацией;
 - освещение территории строительной площадки;
 - оснащение административно-бытовых помещений первичными средствами пожаротушения (по 2 огнетушителя на 1 бытовку) и оборудование их автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт охраны;
 - установка противопожарных постов и оснащение их противопожарным инвентарём: топорами, баграми, лопатами, огнетушителями, бочками с водой и ящиками с песком;
 - установка на въездах-выездах и на территории строительной площадки щитов с информационными и предупредительными плакатами, на которых указывается:
 - схема движения автотранспорта и знак ограничения скорости-5км/ч.
 - план пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.114-82* (СБТ(п.575 ПБ 01-03) на несанкционированном строящихся зданиями и сооружениями, въездами и подъездами, местонахождением водосточников, средств пожаротушения и связи;
 - согласование проектно - сметной документации и открытие ордера на право производства работ.
 - Марка строительных машин и механизмов уточняется в проектах производства работ.
 - Временные сооружения для нужд строительства - инвентарные, контейнерного типа, внешними габаритами 6,0x2,4x2,5 м.
 - Складирование строительного мусора на стройплощадке не допускается.
 - Снабжение строительства электроэнергией и водой осуществляется от действующих источников по согласованию с эксплуатирующей организацией.
 - Ответственность за пожарную безопасность на период строительных работ несёт строительная организация.
 - Временное ограждение строительной площадки принимается инвентарное на фундаментных блоках типа ФБС.
 - Все работы по строительству производить в строгом соответствии с требованиями:
 - СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";
 - "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390
 - "Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъёмных кранов" ПБ 10-382-00
 - МДС 12-19.2004 "Механизация строительства. Эксплуатация дашенных кранов в тесных условиях";
 - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1 "Общие требования".
 - СНиП 12.04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2.
 - СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84".
 - СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87".
 - СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
 - ГОСТ 12.3.009-76* "СБТ Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности".
 - Проекта производства работ, разработанного специализированной организацией.
 - При производстве работ на всех технологических процессах необходимо обеспечить безопасные условия труда для рабочих.


Конструкция ограждения стройплощадки

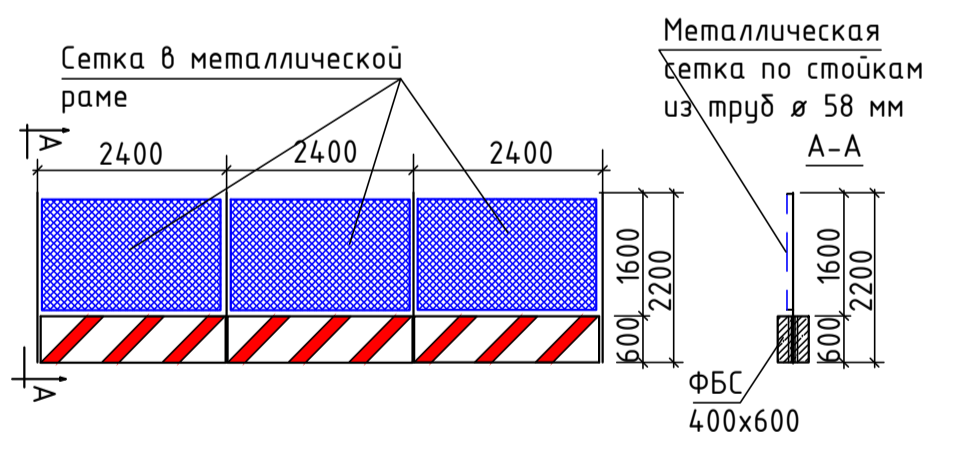

Пожарный стенд

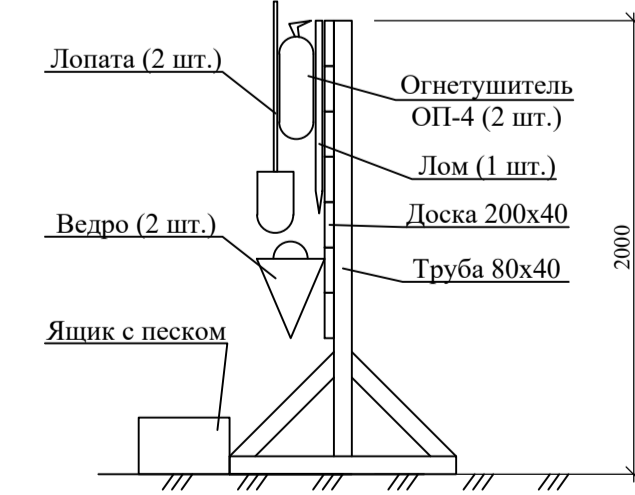

Устройство бытового городка

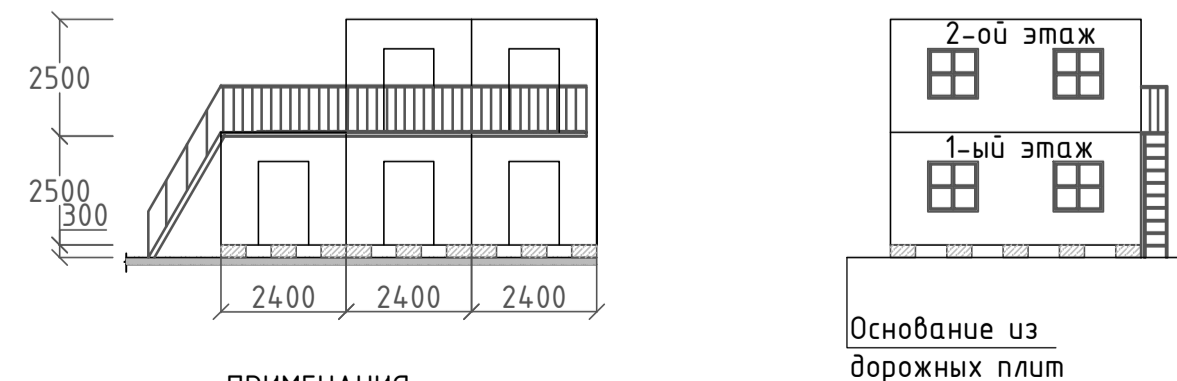

- ПРИМЕЧАНИЯ**
- Лестницы выполнить согласно ГОСТ 23120-78 "Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные".
 - Установку контейнеров производить на блоки ФБС 24-3-6 (2400x300x600).

					1-129-2009-ПЭС			
					Производственный комплекс по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, станция Шуйская, Кондопожское шоссе, д.8			
Изм.	Коп.уч.	Лист	И. док.	Подпись	Дата	Стр.	Лист	Листов
Г/ИП	Варламов В.С.					1	1	1
Г/АП	Кинтов А.А.							
Выполнил	Митяшенков							
Проект организации строительства						Стройгенплан М 1:500		
						ООО "Корф"		
