
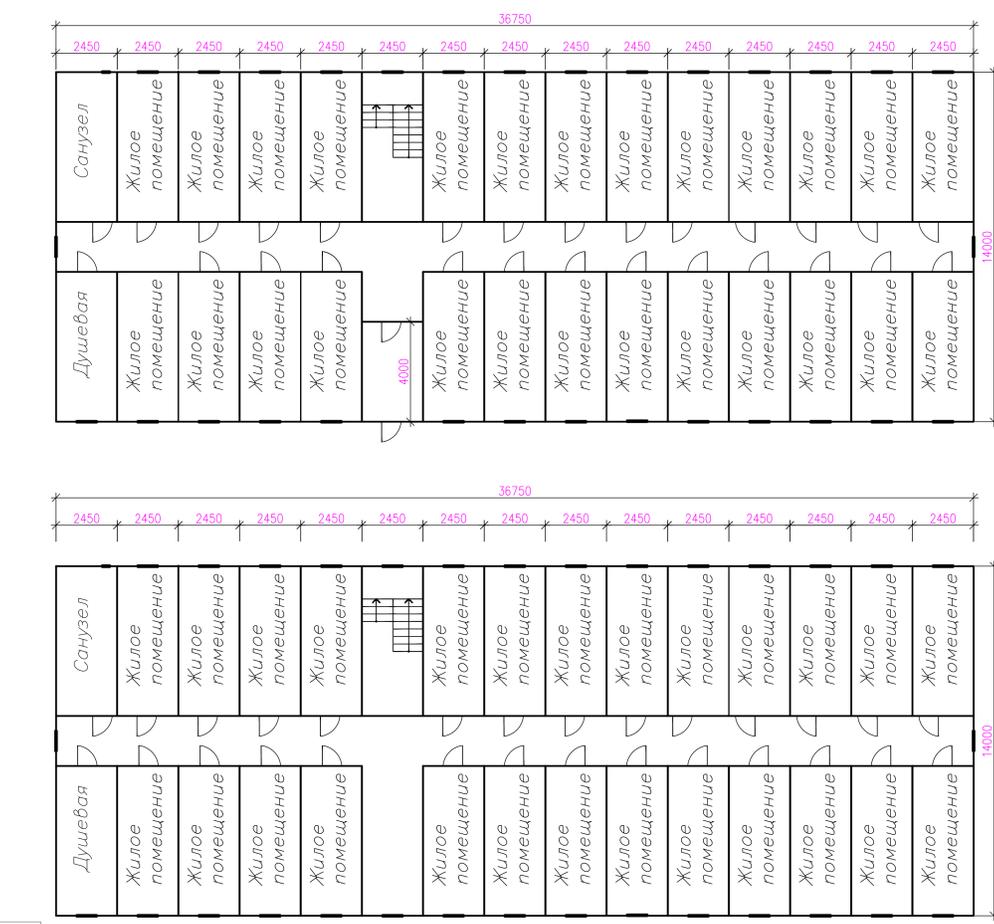



Поз	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Бытовое помещение	1,3	
2	Комната приема пищи	1	
3	Геозвездная служба (горюхи + сети)	1	2 человека, 000 "ДМУ"
4	Геозвездная служба, по ИССО, полевники	1	2 человека, 000 "ДМУ"
5	Заместитель руководителя проекта	1	000 "ДМУ"
6	Руководитель проекта	1	000 "ДМУ"
7	Архив ПТО	1	4 человека, 000 "ДМУ"
8	Геозвездная служба, камералка	1	4 человека, 000 "ДМУ"
9	ПТО	1	000 "ДМУ"
10	Геозвездная служба	1	"Строитрансгаз"
11	Переворочная (малый зал совещания)	1	
12	Большой зал совещания	1	
13	Архив	1	АО "Строитрансгаз"
14	Служба строительного контроля	1	АО "Строитрансгаз"
15	Дирекция	2	АО "Строитрансгаз"
16	Директор проекта	1	АО "Строитрансгаз"
17	Техническое помещение	1	
18	Архив	1	Зоначик
19	Служба строительного контроля	1	Зоначик
20	Санузел	2	

Ограждение глухое на блоках ФБС Н-3м (ограждается строительная площадка и здание штиба с облицовками)



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	Условные обозначения
1	Ограждение площадки (ФБС-профнастил)	п.м.	585		BS
2	Старая для прокладки кабеля	шт	6		
3	Кабель электрический	п.м.	287		
4	Отверстия в стенах	шт	1		
5	Лунки под колеса	шт	1		
6	Земление бытового зордга, АБК, складов, объектов	м	254		
7	Контур заземления	шт	7		
8	Крепление кабеля на ограждение строительной площадки	шт	150		
9	Крепление кабеля на бытовые вазоны	шт	8		
10	Складирование металлопроката и арматуры	м ²	336		
11	Бытовые вазоны	шт	10		
12	Складские помещения контейнерного типа	шт	6		
13	Плиты асбеста	шт	2		
14	Битумная мастика	шт	3		
15	Покрасочный аппарат	шт	2		
16	ТБО	шт	1		
17	Проектор РКУ 1000(2000)	шт	36		
18	Емкость для воды	шт	2		
19	Ворота/шлюзы	шт	2		
20	Клети для блочной с/холодильной	шт	2		
21	Клети для блочной с/холодильной	шт	2		
22	Мачта для освещения и видеонаблюдения	шт	12		
23	ЭЗ	шт	1		
24	Дорожные знаки 1.24 (ограничение максимальной скорости)	шт	2		
25	Скважина для забора воды	шт	1		
26	Лаборатория	шт	1	Возв.-бытовка	
27	Административно-бытовой комплекс №1	шт	1	Шоф строительство	
28	Административно-бытовой комплекс №2	шт	2	Общественный	
29	Ограждение объектов	п.м.	158		
30	Скважина	шт	1	Блок-контейнер 2,5x9x1,5м	
31	Плиты ПАТ-18	шт	96	Для фундамента АБК и объектов	
32	Песок средней крупности	м ³	478	Для фундамента АБК и объектов	
33	Сетка	шт	2		

Условные обозначения
 - - - Движение техники
 - - - Движение людей

Примечания:
 1. Места хранения кислорода и пропана оборудовать специальными знаками.
 2. На выездах и территориях строительного зордга скорость движения ограничивается 5 км/ч (параметры знака 3.24 "Ограничение максимальной скорости"). Знак установить на опору для прокладки кабеля.
 3. Допускается устройство ограждения в соответствии с чертежом 000 "ДМУ", по объекту аналогу (Лобня-Шереметьево).
 4. В качестве жесткого покрытия разрешается использовать ж.б. плиты ПАТ или асбестовые плиты 1750x3000, 2000x3000.
 4.1 - Вязанная замена на монолитное покрытие.
 5. Допускается применение бетона В15-В30 при устройстве паркинга.
 6. Организовать 1 раз в неделю откачку из сетки.
 7. Провести скважину для забора воды.

Координаты АБК. (Угловые точки здания)			Координаты Общественный №1. (Угловые точки здания)			Координаты Общественный №2. (Угловые точки здания)			Координаты Лаборатории. (Угловые точки здания)		
Точка	X	Y	Точка	X	Y	Точка	X	Y	Точка	X	Y
T1	446932,42	2205231,55	T5	446803,76	2205101,94	T9	446885,01	2205126,18	T13	446897,14	2205197,14
T2	446908,12	2205248,08	T6	446800,61	2205115,59	T10	446881,86	2205139,82	T14	446872,69	2205197,82
T3	446900,24	2205236,51	T7	446864,80	2205107,33	T11	446846,05	2205131,57	T15	446870,98	2205192,07
T4	446924,55	2205219,97	T8	446867,95	2205093,69	T12	446849,19	2205117,93	T16	446873,28	2205191,38
