Стройгенплан М1:1000. 2 и 3 этапы

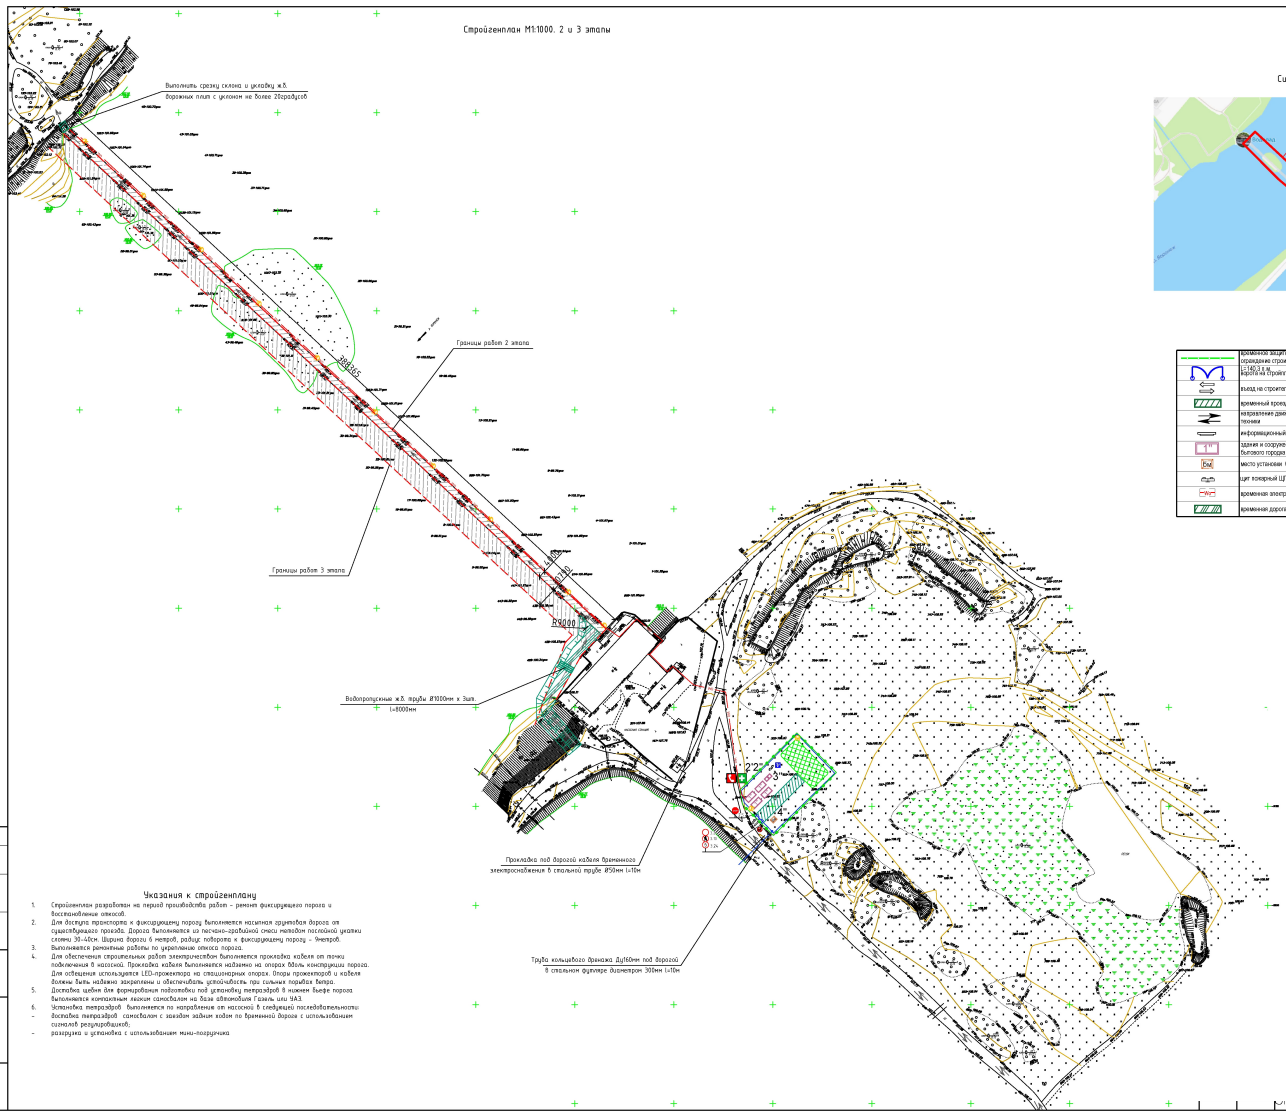

Ситуационный план

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	временное защитное ограждение ограждение строительной площадки (СТАО 2.1 м)		знак пожарной безопасности F05 по ГОСТ Р 12.4.026-2001
	ворота на стройплощадку		запрещающий знак Р.09 по ГОСТ Р 12.4.026-2001
	выезд на строительную площадку и выезд		указательный знак Д.03 по ГОСТ Р 12.4.026-2001
	временный проезд из ж/б дорожных плит		знак медицинского и санитарного назначения ЕС.01 по ГОСТ Р 12.4.026-2001
	направление движения строительной техники		площадка складирования строительных материалов
	информационный щит	2.5	устанавливаемый дорожный знак и его номер по ГОСТ Р 52290-2004
	здания и сооружения строительного бытового городка		
	место установки бункера для строймусора		
	щит пожарный ЩП-А		
	временная электросеть		
	временная дорога из щебня		

Указания к стройгенплану

1. Стройгенплан разработан на период производства работ – ремонта фиксирующего порога и восстановления откосов.
2. Для доступа транспорта к фиксирующему порогу выполняется насыпная грунтовая дорога от существующего проезда. Дорога выполняется из песчано-гравийной смеси методом послойной укатки толщиной 30-40см. Ширина дороги 6 метров, радиус поворота к фиксирующему порогу – 9метров.
3. Выполняются ремонтные работы по укреплению откоса порога.
4. Для обеспечения строительных работ электричеством выполняется прокладка кабеля от точки подключения в насосной. Прокладка кабеля выполняется надземно на опорах вдоль конструкции порога. Для освещения используются LED-прожектора на стационарных опорах. Опоры прожекторов и кабеля должны быть надежно закреплены и обеспечивать устойчивость при сильных порывах ветра.
5. Доставка щебня для формирования подготовки под установку тетраэдров в нижнем бьефе порога выполняется контейнерным мини самосвалом на базе автомобиля Газель или УАЗ.
6. Установка тетраэдров выполняется по направлению от насосной в следующей последовательности:
- доставка тетраэдров самосвалом с заездом задним ходом по временной дороге с использованием сигналов регулировщиков;
- разгрузка и установка с использованием мини-погрузчика

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Формат А1
