58-У/012013-ПОР

Ситуационный план



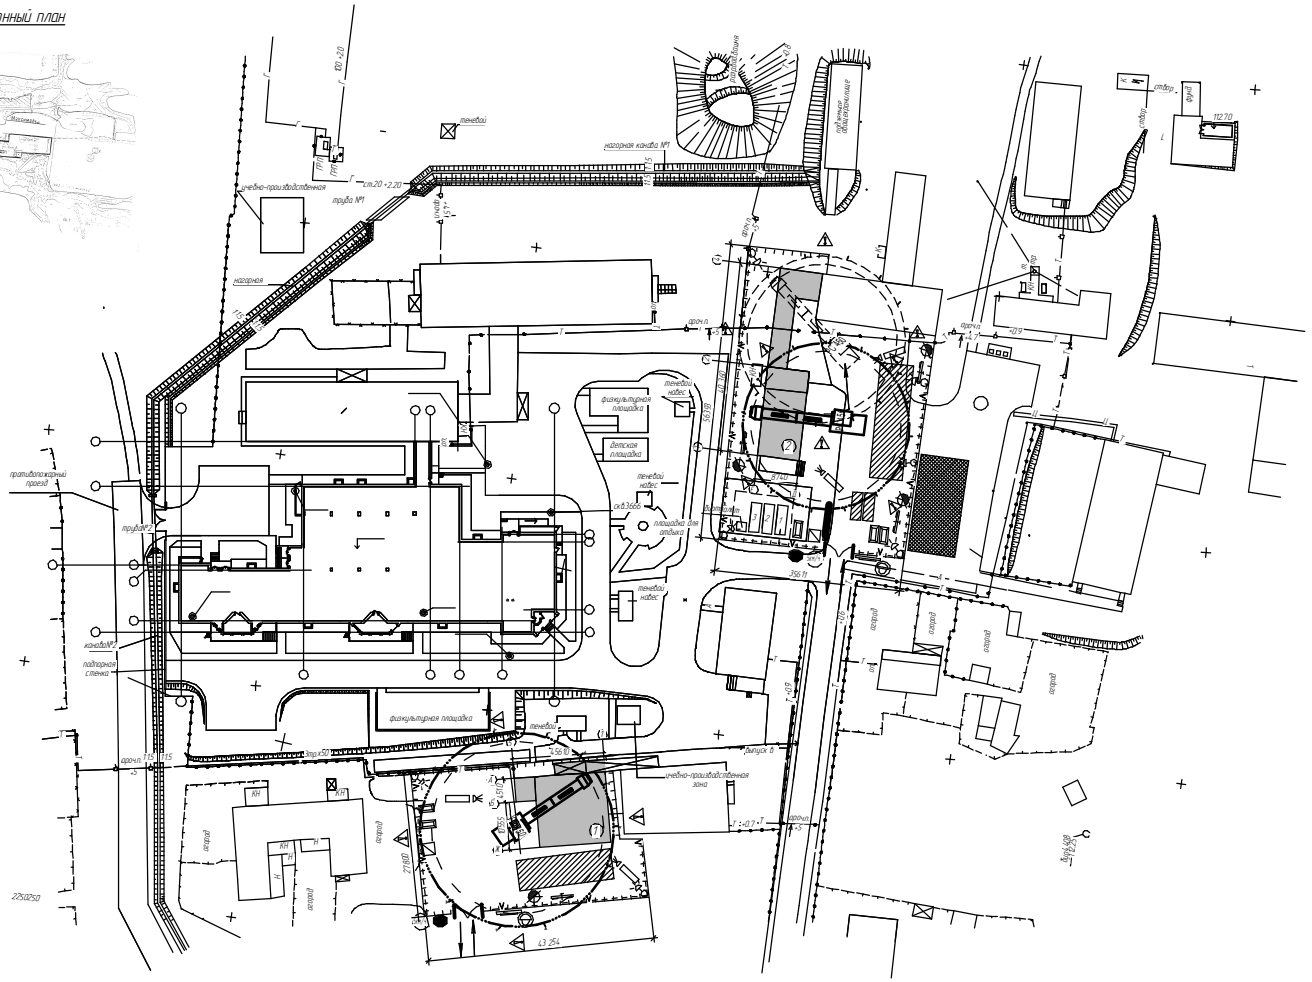

Ведомость зданий и сооружений

№ на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Зданий	Площадь, м2				Строительный объем, м3	
				Застройки		Общая нормируемая			
				Здания	Всего	Здания	Всего	Здания	Всего
1	Здание конторы (демонтируемое)	2	1	651,01	651,01				
2	Здание школы (демонтируемое)	2	1	352,75	352,75				

Условные обозначения

	Демонтируемые сооружения		Ограждение строительной площадки с козырьком
	Существующие здания и сооружения		Временное осветительная эл. линия
	Бытовые помещения		Прожектор ПЗС-45 на опоре
	Открытая складская площадка для демонтируемых конструкций		Распределительный щит рубильник
	Контейнер для сбора бытового мусора		Пункт мойки колес
	Стенд с противопожарным инвентарем		Ось движения экскаватора
	Пожарный гидрант		Въезд, выезд
	Установка пылеподавления		Дизель электростанция
	Ворота		Дорожный знак "Движение без остановки запрещено" 2,5
	Въездной стенд с транспортной схемой	5км/ч	Знак ограничения скорости
	Стоянка строительной техники		Работать в защитной каске
	Точка установки предупредительных и запрещающих знаков		Шлагбаум
	Границы зоны, опасной для нахождения людей во время работы машин		Зона работы машины

Ограждение временного строительного городка



1- металлическая сетка "Рабица" на металлическом каркасе
2- фундаментный блок ФБС-2,4х0,6х0,4
3- стойки

Временное ограждение строительной площадки по ГОСТ 23407-78

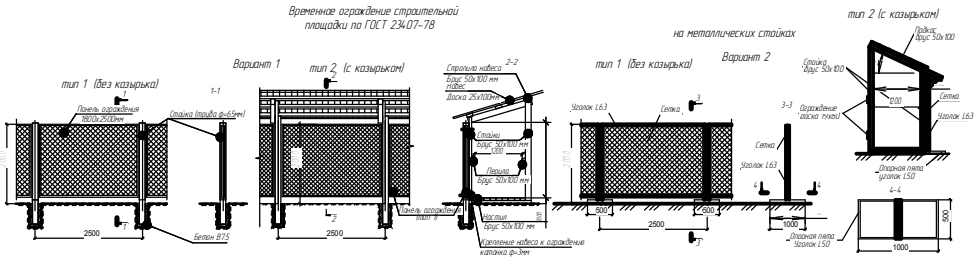

						58-У/012013-ПОР	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Демонтаж помещений здания конторы с пристроем и здания школы с пристроями в ОГКУСО ДДИ для ГУОД "Родник" в с. Максимовка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Терпилавская						
Пров.		Куликзин				Лист 1	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.		Соколова			План участка работ	ООО "МК-проект"		
Утв.		Куликзин						

Копировал Формат А1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата
