


Идентификатор работ	Название работы	% выполнения	Начало	Окончание	Основной ресурс
<b>DR-1.КНГ. Радиофикация зданий 1 этапа</b>					
<b>DR-1.СТР. Общая структура проекта</b>					
<b>DR-1.СТР.Тендер. Тендерная часть</b>					
КНГ	Получение конкурсной документации	100%	01-Авг-1	01-Авг-1	Бровкин.Александр
КНГ	Изучение проектной документации	100%	02-Авг-1	04-Авг-1	Савосина.Татьяна
КНГ	Отправка ценовых запросов производителям	100%	04-Авг-1	05-Авг-1	Коренькова.Елена
КНГ	Определение стоимости выполнения работ	100%	04-Авг-1	08-Авг-1	Куликов.Анатолий
КНГ	Подготовка документации конкурсного предложения	100%	08-Авг-1	11-Авг-1	Савосина.Татьяна
КНГ	Подана конкурсная документация	100%	11-Авг-1	11-Авг-1	Савосина.Татьяна
КНГ	Розыгрыш тендера	100%	12-Авг-1	12-Авг-1	Бровкин.Александр
<b>DR-1.СТР.Подготовка. Планирование</b>					
КНГ	Подписание договора	100%	15-Сен-1	15-Сен-1	Бровкин.Александр
КНГ	Разработка календарного графика	0%	19-Сен-1	21-Сен-1	Чашин.Олег Юрьевич
КНГ	Формирование перечня ПСД	25%	15-Сен-1	20-Сен-1	Чашин.Олег Юрьевич
КНГ	Согласование с Заказчиком перечня ПСД	0%	20-Сен-1	23-Сен-1	Куликов.Анатолий
КНГ	Подготовка разрешительной документации и ППР	25%	15-Сен-1	22-Сен-1	Гречищев.Артем Г
КНГ	Согласование Заказчиком РД и ППР	0%	19-Сен-1	20-Сен-1	Гречищев.Артем Г
КНГ	Назначение руководителя проекта	100%	15-Сен-1	15-Сен-1	Бровкин.Александр
КНГ	Формирование списка требуемого персонала	0%	16-Сен-1	16-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Утверждение списка персонала	0%	19-Сен-1	21-Сен-1	Бровкин.Александр
КНГ	Формирование списка требуемой техники и инструментов	0%	16-Сен-1	16-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Согласование списка инструмента	0%	19-Сен-1	20-Сен-1	Бровкин.Александр
КНГ	Заказ и оплата материалов и оборудования	0%	20-Сен-1	23-Сен-1	Коренькова.Елена
КНГ	Процедура входного контроля материалов и оборудования	0%	26-Сен-1	26-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Получение рабочей документации проектов со штампом в	50%	15-Сен-1	16-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Формирование списка сотрудников для прохождения ТБ	0%	22-Сен-1	23-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Формирование и передача списков с размерами форменной	0%	22-Сен-1	23-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
<b>DR-1.СТР.Реализация. Реализация проекта</b>					
КНГ	Получение техники и инструментов от поставщика	0%	26-Сен-1	26-Сен-1	Коренькова.Елена
КНГ	Получение форменной одежды	0%	26-Сен-1	26-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Инструктаж для сотрудников по ТБ	0%	27-Сен-1	27-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Получение аттестационных удостоверений	0%	27-Сен-1	27-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Монтажные работы	0%	29-Сен-1	10-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Установка абонентского трансформатора (Тит 12)	0%	29-Сен-1	29-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Установка абонентского трансформатора (Тит 43)	0%	29-Сен-1	29-Сен-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помеще	0%	03-Окт-16	05-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Монтаж пластмассовых коробов (Тит 43)	0%	03-Окт-16	04-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и	0%	05-Окт-16	07-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Настройка простых сетевых трактов программирование си	0%	12-Окт-16	13-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Установка абонентского трансформатора (Тит 53.1- 53.7)	0%	10-Окт-16	11-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помеще	0%	10-Окт-16	11-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Монтаж пластмассовых коробов (Тит 53.1- 53.7)	0%	12-Окт-16	18-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и	0%	17-Окт-16	27-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Настройка простых сетевых трактов программирование си	0%	27-Окт-16	31-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Установка абонентского трансформатора (Тит 73)	0%	21-Окт-16	24-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помеще	0%	21-Окт-16	24-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Монтаж пластмассовых коробов (Тит 73)	0%	24-Окт-16	26-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и	0%	27-Окт-16	28-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Настройка простых сетевых трактов программирование си	0%	31-Окт-16	01-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Установка абонентского трансформатора (Тит 70)	0%	28-Окт-16	31-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помеще	0%	28-Окт-16	31-Окт-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Установка винилластовой трубы (Тит 70)	0%	01-Ноя-1	02-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Затягивание проводов в проложенные трубы и металличе	0%	01-Ноя-1	02-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Настройка простых сетевых трактов программирование си	0%	03-Ноя-1	07-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Монтаж дуплексного или абонентского усилителя (Тит 40)	0%	08-Ноя-1	09-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Монтаж радиотрансляционных узлов (Тит 40)	0%	08-Ноя-1	09-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Контроль исполнения задач проекта	0%	21-Сен-1	18-Ноя-1	Чашин.Олег Юрьевич
КНГ	Подготовка ИД	0%	12-Окт-16	15-Ноя-1	Чашин.Олег Юрьевич
КНГ	Подписание промежуточного ИД Заказчиком	0%	15-Ноя-1	18-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Завершение монтажных работ	0%	15-Ноя-1	18-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Индивидуальные испытания смонтированного оборудовани	0%	15-Ноя-1	16-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Комплексные испытания смонтированных систем	0%	17-Ноя-1	25-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
<b>DR-1.СТР.Завершение. Завершение проекта</b>					
КНГ	Проверка конечного комплекта ИД	0%	14-Ноя-1	25-Ноя-1	Чашин.Олег Юрьевич
КНГ	Передача Заказчику конечного комплекта ИД	0%	28-Ноя-1	28-Ноя-1	Чашин.Олег Юрьевич
КНГ	Подписание Заказчиком справки об отсутствии замечаний	0%	29-Ноя-1	29-Ноя-1	Чашин.Олег Юрьевич
КНГ	Инвентаризация строительных материалов после заверше	0%	21-Ноя-1	22-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Возврат службе Заказчика оставшейся части принадлежа	0%	23-Ноя-1	24-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Отправка на склад неотребоваанного оборудования и ма	0%	23-Ноя-1	24-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Вывоз упакованных инструментов и средств индивидуаль	0%	25-Ноя-1	28-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Закрытие вопроса с прошиванием персонала проекта	0%	28-Ноя-1	29-Ноя-1	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Транспортировка персонала проекта в головной офис орг	0%	29-Ноя-1	30-Ноя-1	Жижин.Владимир
КНГ	Закрытие у Заказчика форм: КС-2, КС-3, КС-6а и КС-11	0%	29-Ноя-1	01-Дек-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Подписание у Заказчика пакета сметно-финансовой докум	0%	29-Ноя-1	01-Дек-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Передача подписанной документации проекта в архив	0%	02-Дек-16	06-Дек-16	Рубин.Аркадий Ва
КНГ	Сдача финансового отчета	0%	02-Дек-16	06-Дек-16	Рубин.Аркадий Ва



█ Выполненное █ % выполненного  
█ Оставшееся █ Сводное  
█ Критическое

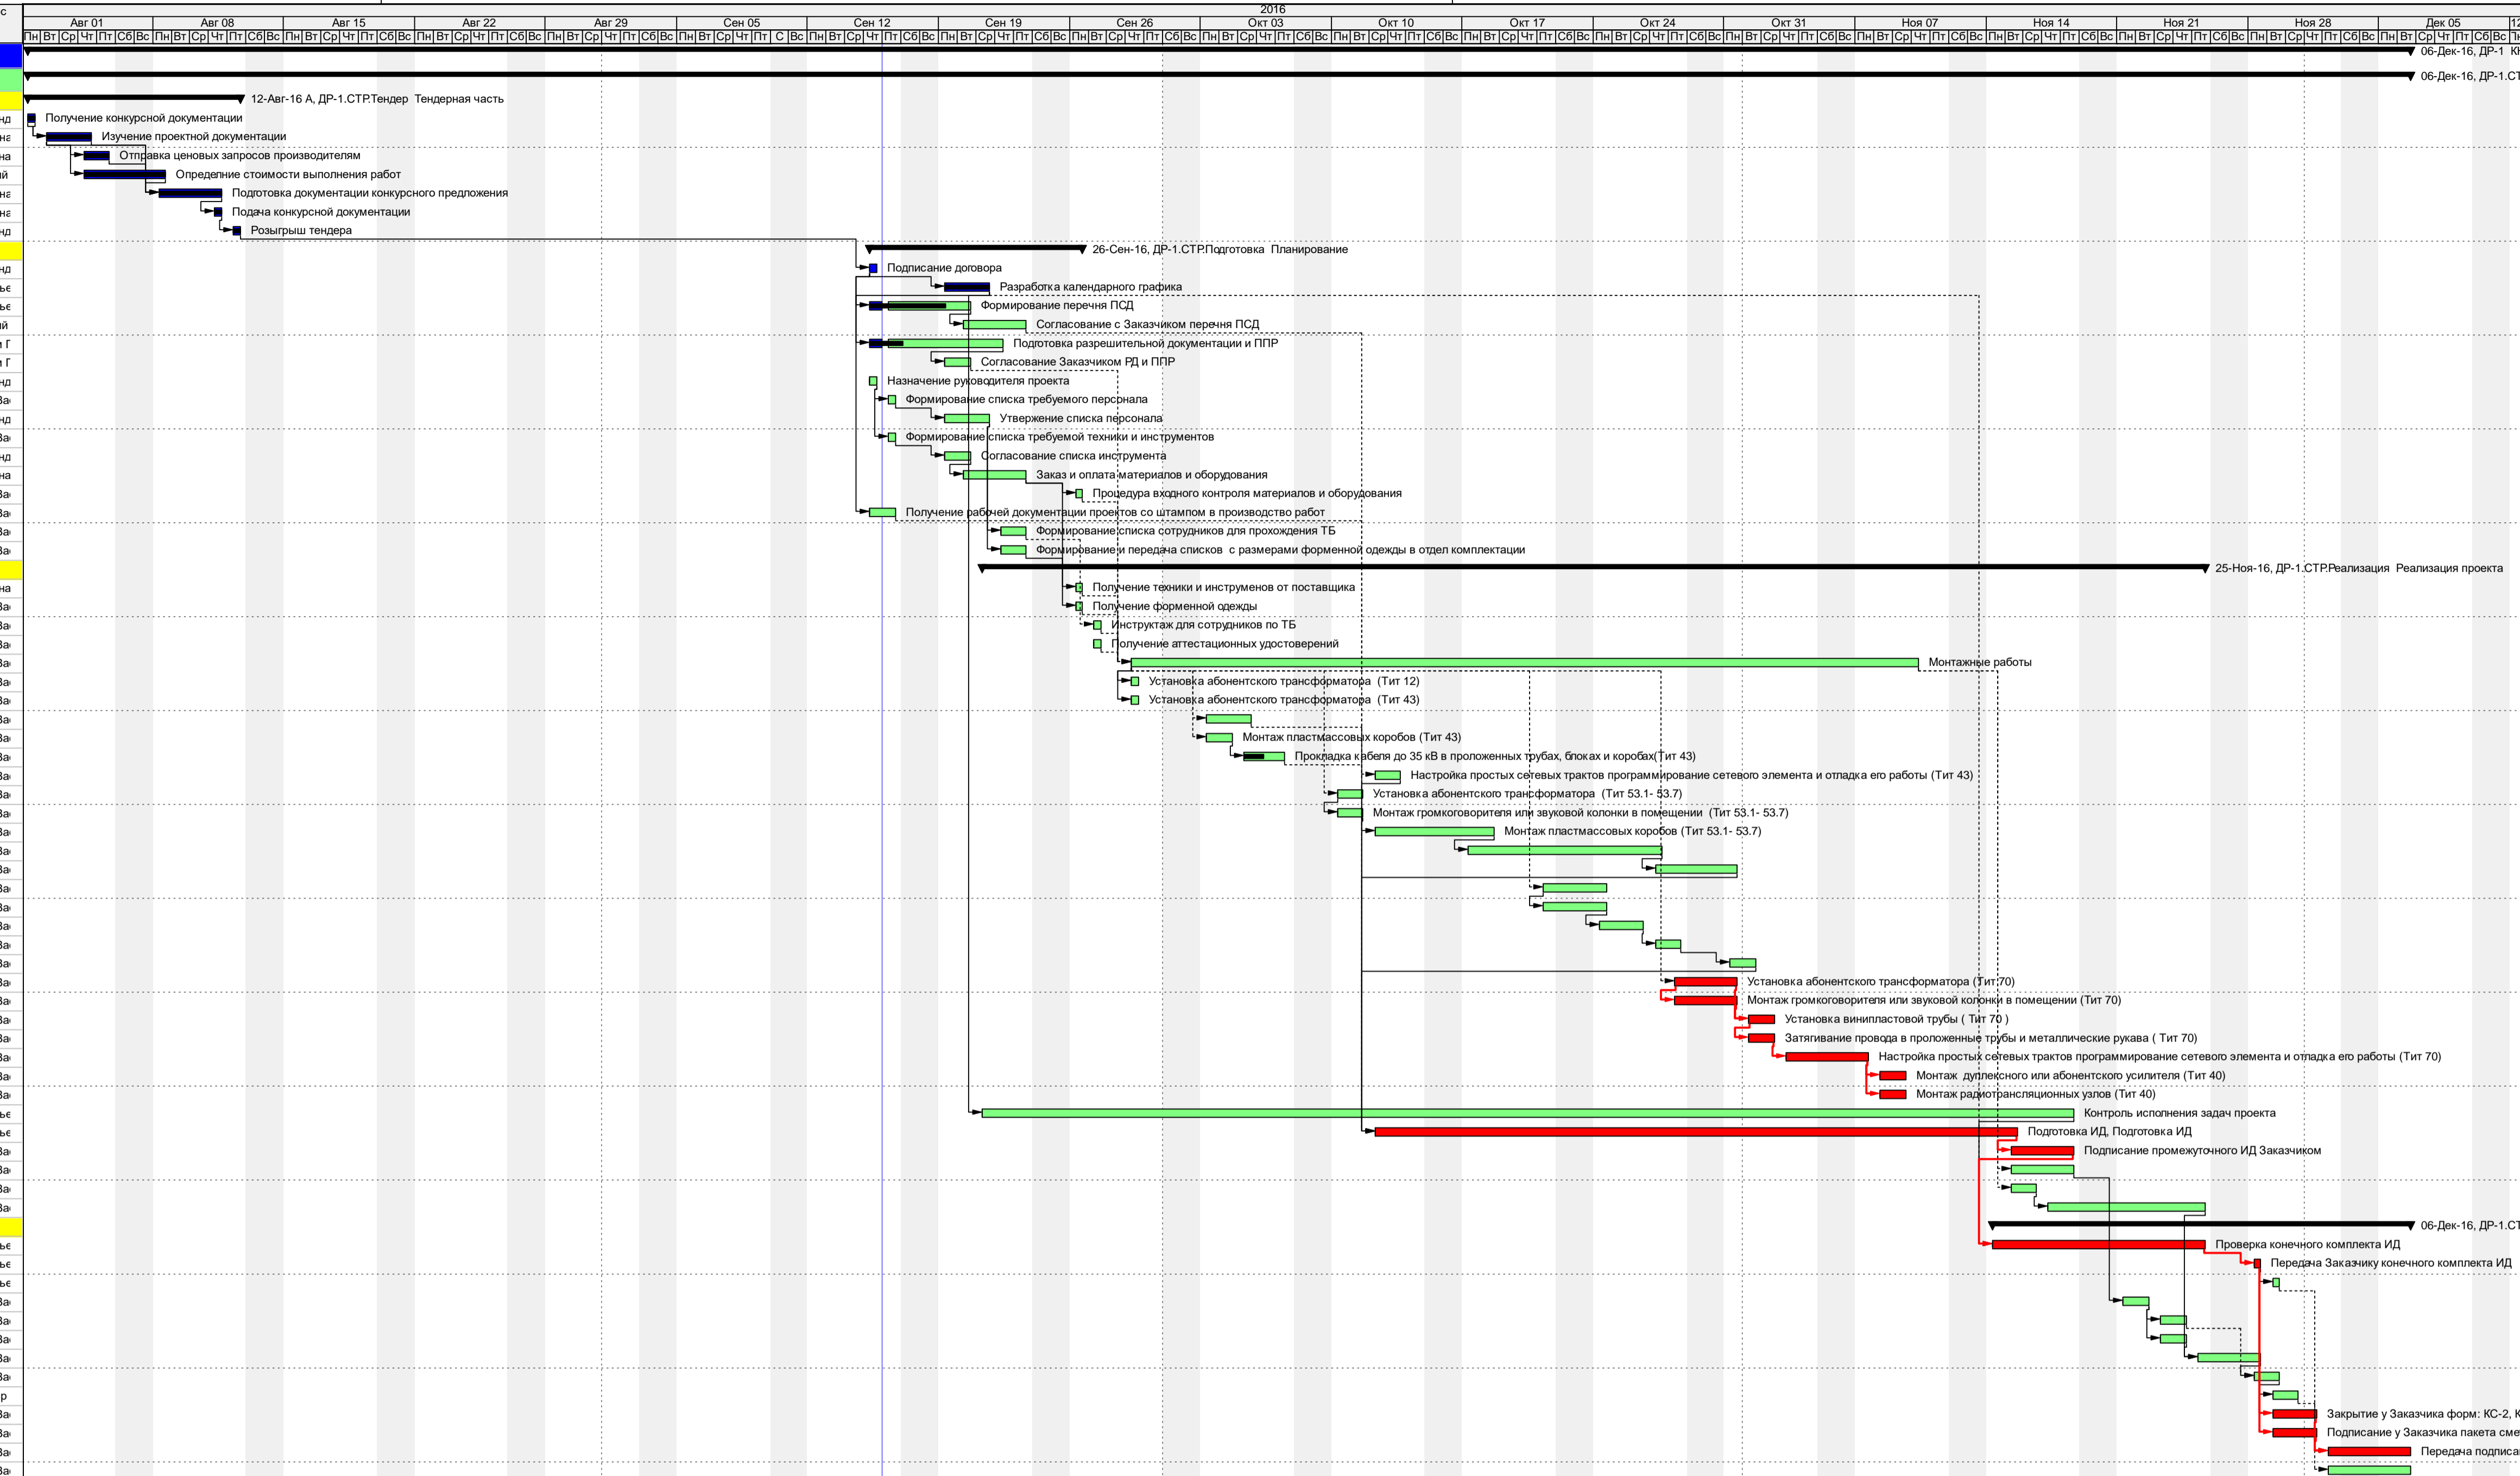
